




KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
Projektnr.: 00821-202-KCK
Anlage : 2.12
Maßstab : 1: 50

RKS 1

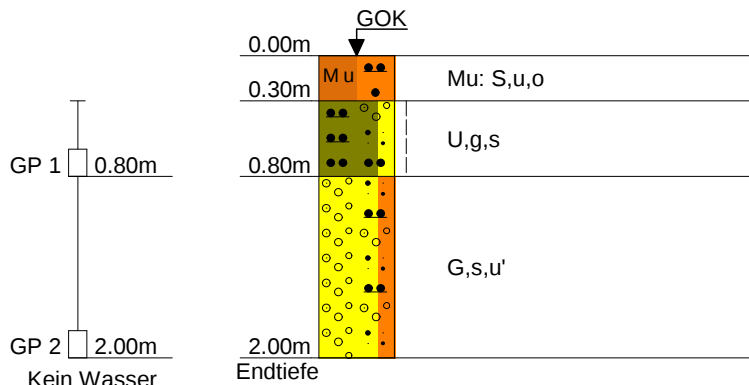

Bodenluftentnahme:
1,0 - 2,0 m unter GOK



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.12**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. RKS 1


Blatt 3

Datum:
24.10.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.30	a) Mutterboden: Sand, schluffig, org. Beimengung				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht			
	b)							
	c)	d) I, leicht rammbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.80	a) Schluff, kiesig, sandig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht	GP	1	0.30 -0.80
	b)							
	c) steif	d) schwer rammbar	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht, kein Wasser	GP	2	0.80 -2.00
	b)							
	c)	d) sehr schwer rammbar	e) grau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.13
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

RKS 2

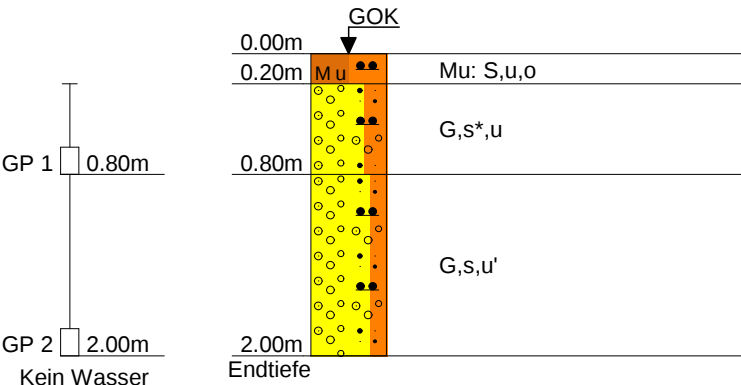

Bodenluftentnahme:
1,0 - 2,0 m unter GOK



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.13**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. RKS 2

Blatt 3

Datum:
24.10.2017


1	2				3	4	5	6
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden: Sand, schluffig, org. Beimengung				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht			
	b)							
	c)	d) leicht rammbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.80	a) Kies, stark sandig, schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht	GP	1	0.20 -0.80
	b)							
	c)	d) schwer rammbar	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht, kein Wasser	GP	2	0.80 -2.00
	b)							
	c)	d) sehr schwer rammbar	e) grau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
Projektnr.: 00821-202-KCK
Anlage : 2.14
Maßstab : 1: 50

RKS 3

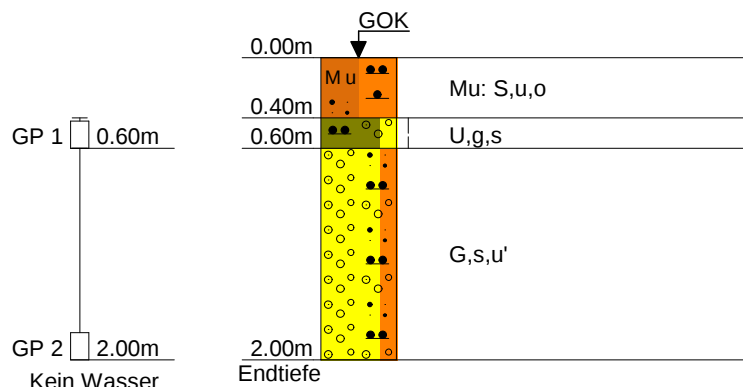

Bodenluftentnahme:
1,0 - 2,0 m unter GOK



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.14**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. RKS 3


Blatt 3

Datum:
24.10.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.40	a) Mutterboden: Sand, schluffig, org. Beimengung				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht			
	b)							
	c)	d) leicht rammbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.60	a) Schluff, kiesig, sandig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht	GP	1	0.40 -0.60
	b)							
	c) steif	d) schwer rammbar	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht, kein Wasser	GP	2	0.60 -2.00
	b)							
	c)	d) sehr schwer rammbar	e) grau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.15
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

RKS 4

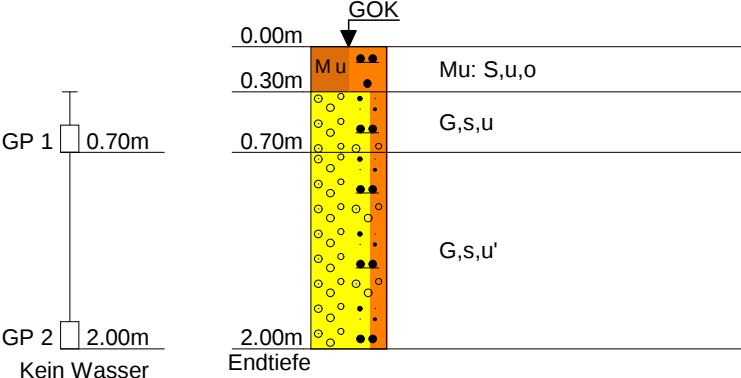

Bodenluftentnahme:
1,0 - 2,0 m unter GOK



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.15**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. RKS 4


Blatt 3

Datum:
24.10.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.30	a) Mutterboden: Sand, schluffig, org. Beimengung				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht			
	b)							
	c)	d) leicht rammbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.70	a) Kies, sandig, schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht	GP	1	0.30 -0.70
	b)							
	c)	d) schwer rammbar	e) braun bis dunkelbraun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht, kein Wasser	GP	2	0.70 -2.00
	b)							
	c)	d) sehr schwer rammbar	e) grau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.16
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

RKS 5



GP 1 0.60m

GP 2 2.00m
Kein Wasser



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.16**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. RKS 5


Blatt 3

Datum:
24.10.2017

1	2				3	4	5	6
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Kies, sandig, schwach schluffig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht, kein Wasser			
	b)							
	c)	d) sehr schwer rammbar	e) grau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				
0.30	a) Mutterboden: Sand, schluffig, org. Beimengung				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht			
	b)							
	c)	d) leicht rammbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.60 Endtiefe	a) Sand, schluffig, schwach kiesig				RKS, Schappe ø 80/60 mm erdfeucht	GP	1	0.30 -0.60
	b)							
	c)	d) mittel rammbar	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.1.1
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 1

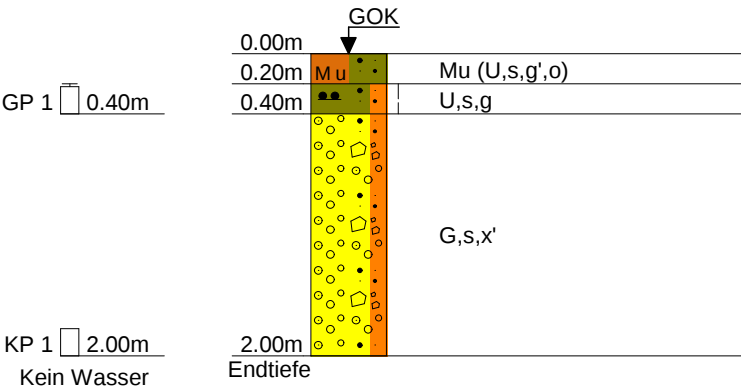



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.1.1**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 1


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.40	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.20 -0.40
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	2.00
	b)							
	c)	d)	e) braungrau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.1.2
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 1a

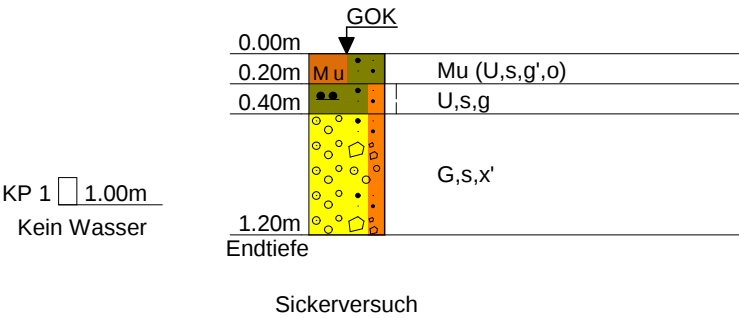



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.1.2**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 1a


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.40	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.20 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	1.00
	b)							
	c)	d)	e) braungrau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.2.1
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 2

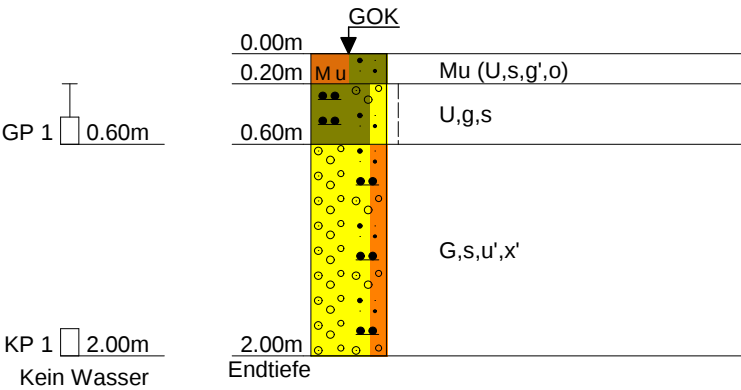



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.2.1**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 2

Blatt 3


Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.60	a) Schluff, kiesig, sandig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.20 -0.60
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	2.00
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
86381 KRUMBACH	Anlage : 2.2.2
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 2a

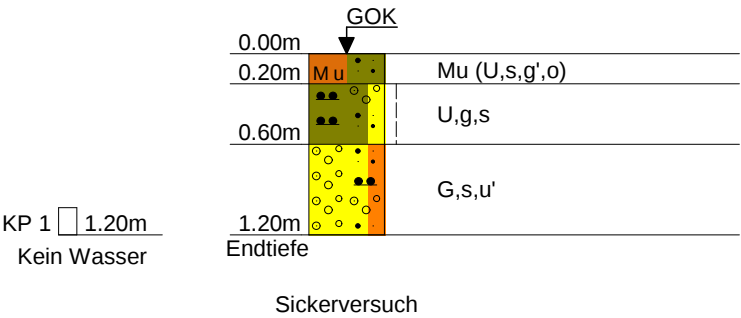



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.2.2**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 2a


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.60	a) Schluff, kiesig, sandig				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.20 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	1.20
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.3
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 3

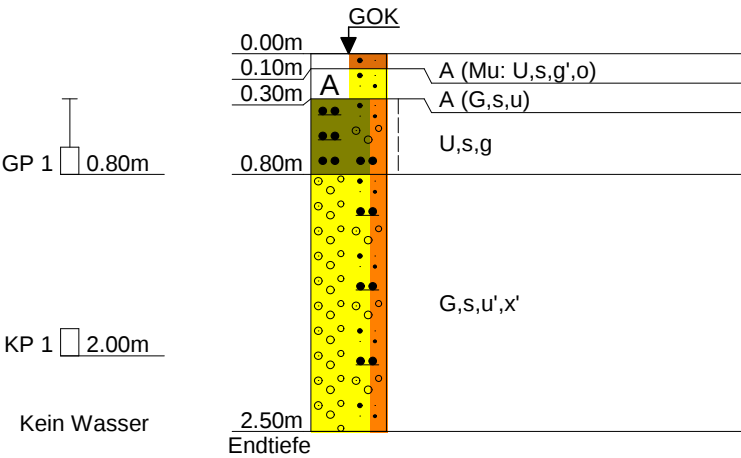



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.3**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 3


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.10	a) Auffüllung (Mutterboden: Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.30	a) Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) grau					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.80	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.30 -0.80
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	2.00
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.4
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 4

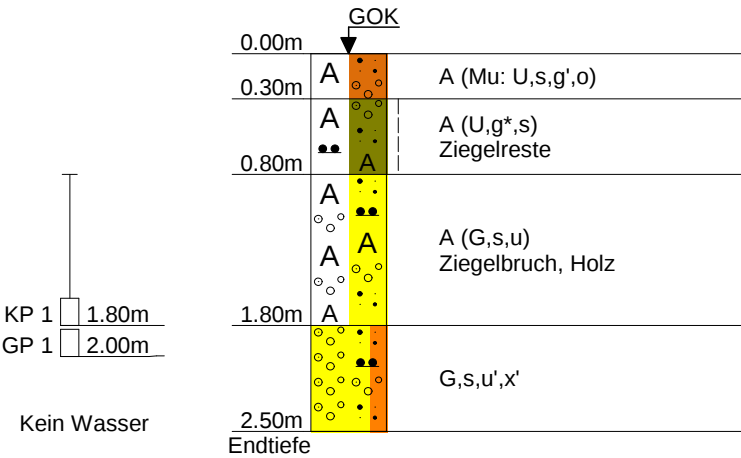



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.4**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 4


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.30	a) Auffüllung (Mutterboden: Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.80	a) Auffüllung (Schluff, stark kiesig, sandig)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b) Ziegelreste							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
1.80	a) Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)				Baggerschurf, erdfeucht	KP	1	0.80 -1.80
	b) Ziegelbruch, Holz							
	c)	d)	e) dunkelgrau					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
2.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	GP	1	2.00
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.5
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 5

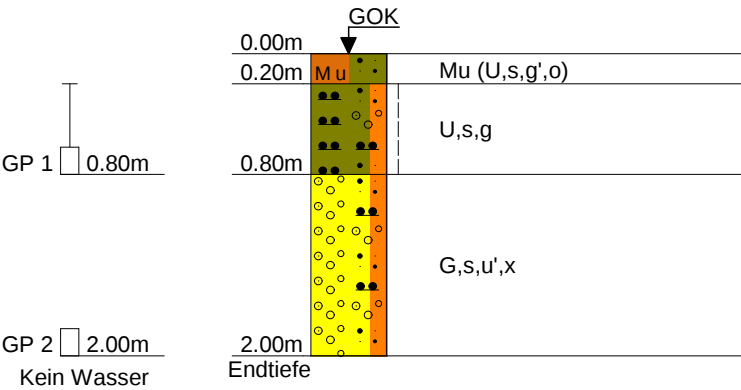



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.1.5**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 5


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.80	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.20 -0.80
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	GP	2	2.00
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.6
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 6

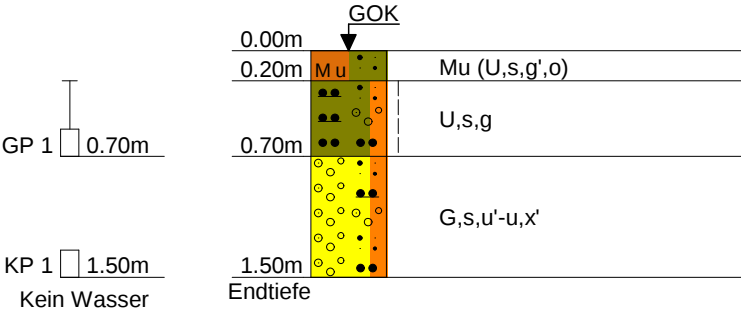



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.6**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 6


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.70	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.20 -0.70
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	1.50
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.7
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 7

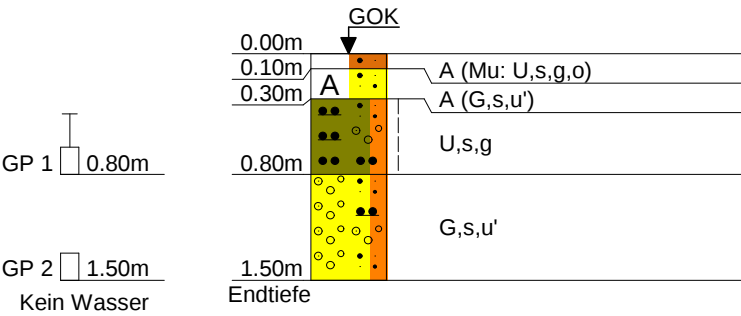



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage 2.7
Bericht:
Az.: 00821-202

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 7


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.10	a) Auffüllung (Mutterboden: Schluff, sandig, kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.30	a) Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) grau					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.80	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.40 -0.80
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	GP	2	1.50
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.8
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 8

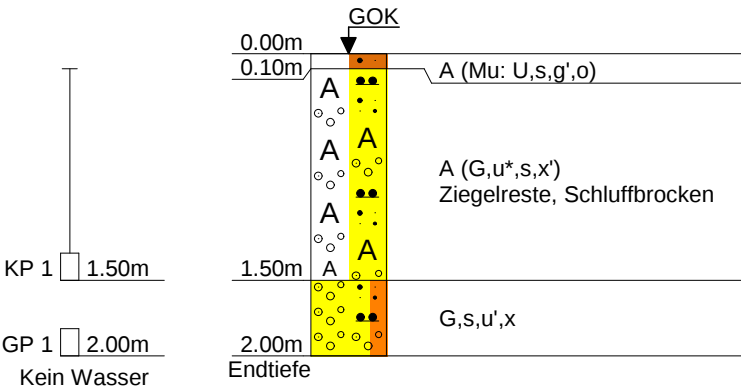



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.8**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 8

Blatt 3

Datum:
06.11.2017


1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.10	a) Auffüllung (Mutterboden: Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
1.50	a) Auffüllung (Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig)				Baggerschurf, erdfeucht	KP	1	0.10 -1.50
	b) Ziegelreste, Schluffbrocken							
	c)	d)	e) braungrau					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
2.00 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	GP	1	2.00
	b)							
	c)	d)	e) braungrau					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
Projektnr.: 00821-202-KCK
Anlage : 2.9
Maßstab : 1: 50

SCH 9

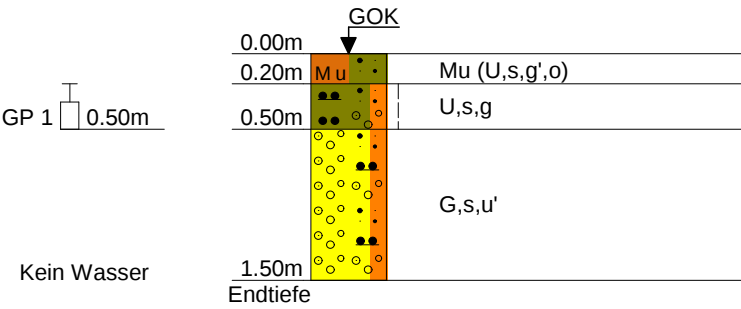



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.9**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 9


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.50	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.20 -0.50
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser			
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.10
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 10

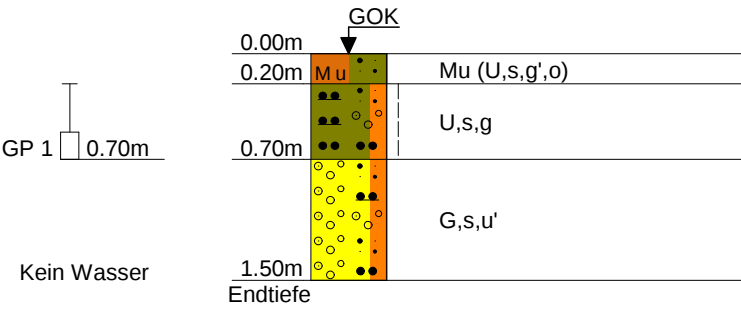



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.10**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 10


Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Holozän	h)	i)				
0.70	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.20 -0.70
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser			
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				

	KLING CONSULT GMBH	Projekt : Denklingen, BBP "Hirschvogel"
	BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 00821-202-KCK
	86381 KRUMBACH	Anlage : 2.11
	TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 11

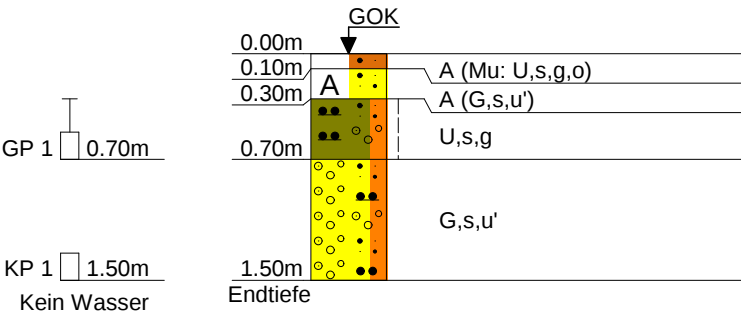



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **2.11**
Bericht:
Az.: **00821-202**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Denklingen, BBP "Hirschvogel"**

Bohrung Nr. SCH 11

Blatt 3

Datum:
06.11.2017

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.10	a) Auffüllung (Mutterboden: Schluff, sandig, kiesig, org. Beimengung)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.30	a) Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)				Baggerschurf, erdfeucht			
	b)							
	c)	d)	e) grau					
	f) Auffüllungen	g) Anthropogen	h)	i)				
0.70	a) Schluff, sandig, kiesig				Baggerschurf, erdfeucht	GP	1	0.30 -0.70
	b)							
	c) steif	d)	e) braun					
	f) Deckschichten	g) Quartär	h)	i)				
1.50 Endtiefe	a) Kies, sandig, schwach schluffig				Baggerschurf, erdfeucht, kein Wasser	KP	1	1.50
	b)							
	c)	d)	e) graubraun					
	f) Terrassenschotter	g) Quartär	h)	i)				
